Alma-Support im BSZ

16. BSZ-Kolloquium in Stuttgart
22.09.2015

Michaela Sieber

Agenda

- Ausgangssituation 2014
- Projekt Alma
- Aktuelles zur SWB-Anbindung
- Services des BSZ
- Ausblick

Ausgangssituation 2014

- Warum wir uns mit Alma beschäftigen?

- 5 gute Gründe
  - HTWK Leipzig
  - HTW Dresden
  - HS Zwickau
  - HS Mittweida
  - Universität Mannheim

→ Alma Early Adopter im SWB

Projekt Alma

- Entscheidung im BSZ für ein Projekt mit Ex Libris
  - Memorandum of Understanding
  - Teststellung für Alma-Institution und Networkzone
  - Mittelfristiges Ziel: attraktive Dienste für Alma-Kunden im SWB zu entwickeln

Arbeitspakete

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

Projektlaufzeit : 10.2014 – 06.2015

1

- **Alma Training (IZ+NZ)**
- → Alle Workflows in allen Arbeitsbereichen von Alma verstehen und anwenden können

2

- **Alma Certification**
- → Zertifizierungs-programm für Berechtigung zur Konfiguration in Alma

3

- **Primo Training**
- → Konfiguration des Backoffice verstehen und anwenden im Zusammenspiel mit Alma

4

- **Implementierung von BSZ-Kunden begleiten**
- → Migrationsprozesse von SWB-Bibliotheken live verfolgen

5

- **Geschäftsmodelle entwickeln**

6

- **Verbundanbindung**
- → Langfristiges Ziel: Vollständige Katalogisierung in Alma

AP1: Alma Training

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

GANTT-DIAGRAMM: ÜBERWACHUNG

	% Abgeschlossen	Task Name	Anfang	Ende	Ressourceng
0	98%	Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg - Alma & Primo implementation	04.08.14	30.06.15	
1	100%	Getting Ready	04.08.14	06.08.14	
19	98%	Alma Implementation	22.09.14	30.06.15	
20	96%	Phase I - Define	22.09.14	30.06.15	
21	100%	Kick off meeting (Webex)	22.09.14	22.09.14	BSZ;Ex Libris
22	100%	Project Meeting (onsite)	27.10.14	27.10.14	BSZ;Ex Libris
23	100%	Standard sandbox provisioned	25.09.14	25.09.14	Ex Libris
24	100%	Access to the Alma Standard Training Sandbox granted	25.09.14	25.09.14	Ex Libris
25	96%	Alma Training	26.09.14	30.06.15	
26	98%	Alma Functionality and Workflows / Institutionzone	26.09.14	26.02.15	
27	100%	Training "Orientation and Concepts"	26.09.14	21.10.14	BSZ
28	100%	Training "Navigation and searching in Alma"	26.09.14	28.10.14	BSZ
29	100%	Training "Resource Management Fundamentals/Day-to Day Operations"	26.09.14	17.11.14	BSZ
30	100%	Training "Electronic Resources Fundamentals and Linking"	29.10.14	15.12.14	BSZ
31	100%	Training "Day-to-Day Workflows for Electronic resources"	29.10.14	15.12.14	BSZ
32	100%	Training "Acquisitions Fundamentals, Automated workflows"	16.12.14	05.02.15	BSZ
33	100%	Training "Day-to-Day Acquisitions"	16.12.14	05.02.15	BSZ
34	100%	Training "Managing funds and Payments"	16.12.14	05.02.15	BSZ
35	100%	Training "More on Resource Management"	16.12.14	05.02.15	BSZ
36	100%	Training "End to End workflows for Acquiring Print Material"	16.12.14	05.02.15	BSZ
37	100%	Training "User Management"	06.02.15	26.02.15	BSZ
38	100%	Training "Fulfillment Fundamentals/Day-to-Day Operations", "Booking in Alma"	06.02.15	26.02.15	BSZ
39	50%	Training "Resource Sharing"	06.02.15	26.02.15	BSZ
40	75%	Alma Special Trainig Topics	06.02.15	30.06.15	
43	100%	Training on Collaborative Workflows / Networkzone	24.10.14	27.02.15	
44	100%	Training "(02) Alma Network Zone Topology - Introduction"	24.10.14	24.10.14	Ex Libris;BSZ
45	100%	Training "(03) Shared Bibliographic Records in the Network Zone - Principles and Overview"	31.10.14	31.10.14	BSZ;Ex Libris
46	100%	Training "(05) Day-to-Day Cataloging Activities in a Network Zone"	21.11.14	21.11.14	Ex Libris;BSZ
47	100%	Training "(04) Importing Bibliographic Records"	28.11.14	28.11.14	Ex Libris;BSZ
48	100%	Training "(07) E-Acquisitions Workflows and Management in Alma Network Zone"	30.01.15	30.01.15	BSZ;Ex Libris
49	100%	Training "(08) PDA Management in Alma Network Zone"	06.02.15	06.02.15	Ex Libris;BSZ
50	100%	Training "(09) Fulfillment Networks"	27.02.15	27.02.15	Ex Libris;BSZ
51	100%	Phase II - Build	22.09.14	06.03.15	
52	100%	Production Environment Preparation	22.09.14	23.12.14	
61	100%	Primo implementation	21.10.14	06.03.15	
82	100%	Phase III - Deploy	23.12.14	30.06.15	
97	100%	Alma Implementation Approach (HTWK)	23.10.14	29.06.15	
98	100%	Introduction on Alma implementation approach / standard documents	23.10.14	23.10.14	Ex Libris;BSZ
99	100%	Send HTWK project plan	28.10.14	28.10.14	Ex Libris
100	100%	Provide "Alma Configuration Form" and "3rd Party Integration Form"	28.10.14	28.10.14	Ex Libris
101	100%	View "Introduction to Alma Configuration", "Alma Configuration Form"	28.10.14	30.11.14	BSZ
102	100%	Join HTWK Alma implementation ...	28.10.14	16.02.15	BSZ
103	100%	Join HTW/WHZ Alma implementation ...	10.02.15	29.06.15	BSZ
104	0%	Project completed	30.06.15	30.06.15	

GANTT-DIAGRAMM: ÜBERWACHUNG

AP 2: Alma Zertifizierung

AP 4: Einbindung in Projekte

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

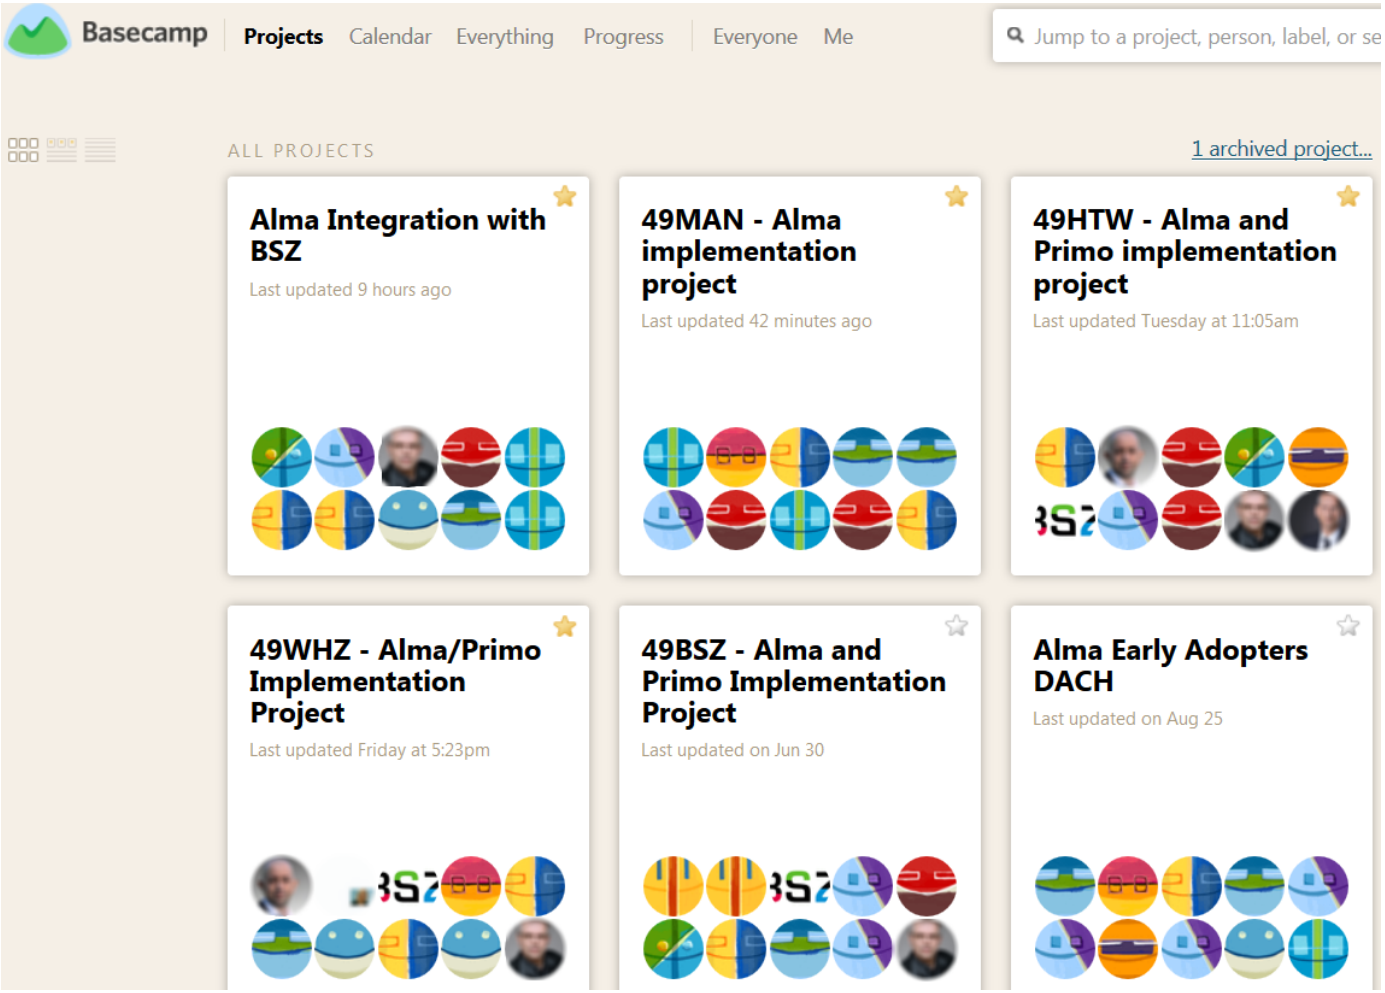

Meilensteine - Highlights

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

- ✓ 22.09.14 – Kick-Off Meeting
- ✓ 01.12.14 – Datenladen in BSZ-Testsysteme
- ✓ 27.02.15 – Ende des Alma-Trainings
- ✓ 26.03.15 – Zertifizierung
- ✓ 15.04.15 – Alma-Workshop für UB Mannheim
- ✓ 13.05.15 – Service Konzept

Aktuelles zur SWB-Anbindung

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

- Fernleihanbindung
  - getestet
- Lokalsatz-Harvesting
  - Wird derzeit getestet
- Deutsche MARC-Erweiterungen
  - In Arbeit

Services des BSZ

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

- Modulares Servicekonzept

  1.) Common Bibliographic Data Zone - CBDZ

  2.) Implementierung

  3.) First Level Support

  4.) Anwendungsentwicklung

Support und Implementierung

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

- Kooperationvereinbarung mit Ex Libris
- Zielgruppe: Bibliotheken bis 30 Mitarbeiter
- Systembibliothekarische Unterstützung
  - Beim Migrationsprozess (Migrationsformulare, Konfiguration, Schulungen, ….)
  - Im Alltag (First Level Support, Step-by-Step Anleitungen, deutschsprachige Releasenotes, …)

Ausblick

- Kooperation mit dem hbz
- Gemeinschaftsprojekt CBDZ

  → Daten der drei Verbünde GBV, hbz und SWB
- Verbundanbindung über die CBDZ

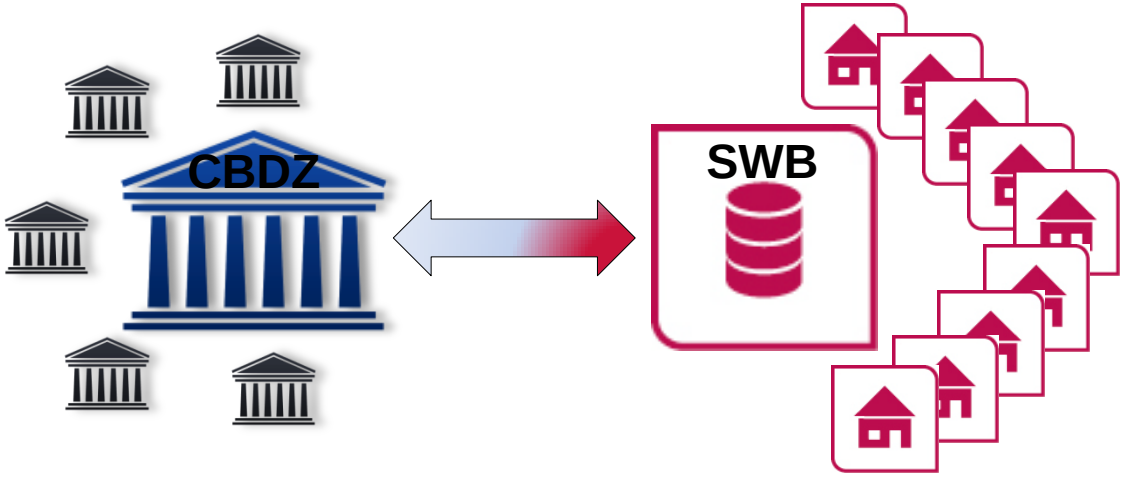

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

Michaela Sieber

Team Bibliothekssysteme

Tel.: 07531 – 88 4282

michaela.sieber@bsz-bw.de
